

- Projektový návrh zacielený na podporu realizácie Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (2018) a jej nástroja – Akčného plánu pre implementáciu (2021)
- Prepojenie na prebiehajúci proces prípravy novej stratégie adaptácie SR (2025)
- Cieľom projektu je vytvoriť funkčný a efektívny rámec pre riešenie adaptácie na zmenu klímy v oblasti udržateľného vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, lesov, biodiverzity, ľudských sídel a zdravia na Slovensku
- Koordinácia SAŽP




LIFE SIP 2024 NATADAPT SK

- Zníženie zraniteľnosti a zvýšenie celkovej adaptačnej schopnosti krajiny vyrovnáť sa s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy prostredníctvom sprístupnenia údajov, informácií a poznatkov, zavedenia mechanizmov monitorovania a hodnotenia, vypracovania a uplatnenia osvedčených postupov, posilnenia inštitúcií a odbornej prípravy ľudských zdrojov
- Adaptačné riešenia a súvisiace poznatky sa budú rozvíjať, demonštrovať a overovať vo vybraných pilotných lokalitách, ktoré zahŕňajú národné parky, povodia, mestá a sieť poľnohosp. fariem
- Prírode blízke riešenia sú efektívne (preventívne opatrenia), pomáhajú budovať odolnosť a súčasne poskytujú environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy

- Projekt je naplánovaný na 10 rokov a prebieha v troch fázach:
 - Prípravná fáza (3 roky)
 - Hlavná realizačná fáza (4 roky)
 - Fáza tvorby udržateľnosti (3 roky)
 - Medzi jednotlivými fázami je možné urobiť korekcie vo WP
- Ukážka, overenie a rozšírenie inovatívnych prírode blízkych adaptačných riešení v pilotných mestách (sídlné prostredie)
- Spoločné plánovanie aktivít - nadväznosť a prepojenie s ostatnými oblasťami – vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesy
- Indikátory dopadov
- Informačný systém, budovanie kapacít, vzdelávanie, osveta

- V sídelnom prostredí, mestá: cieľom je efektívnejšie využívanie vody v sídelnom prostredí prostredníctvom rôznych prírode blízkych adaptačných riešení
- Vytvorenie lokálnych ekosystémov na generovanie a overovanie inovácií zameraných na posilnenie adaptácie miest voči klimatickým zmenám na úrovni pilotných miest
- Realizácia demonštračných opatrení, technológií a odporúčaní z fungovania živých laboratórií („living labs“) – a ich následné rozširovanie
- Vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre poskytovanie informácií a podpory
- Odborné vzdelávanie – program pre samosprávy

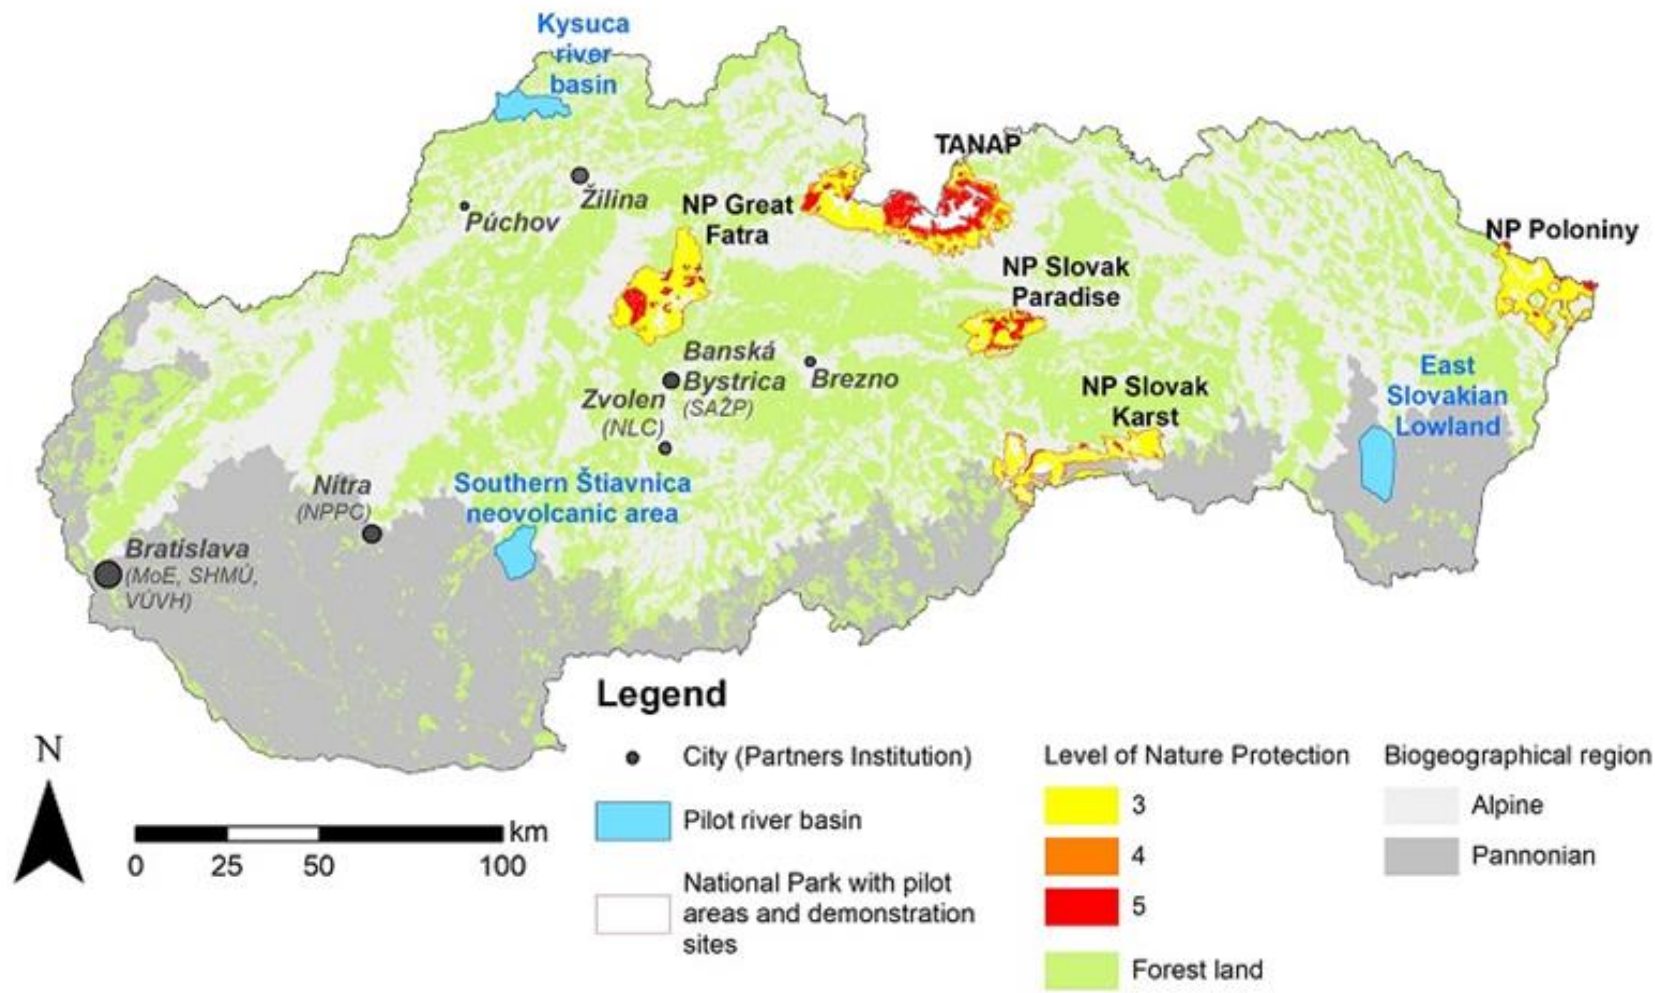

STRATÉGIA – AKČNÝ PLÁN – REALIZÁCIA OPATRENÍ

Hydrological regime and water resources management (Table 4, pp. 44-46)	Deceleration of water runoff from catchment area: natural water retention measures, restoration of wetlands and meanders, supporting inter-connection among watercourses, proper maintenance of riparian vegetation, removal of barriers in watercourses	1.1: Water retention in the landscape and in settlements	Review of technical norms, guidelines for flood threats Methodology for slowing down water runoff by technical measures, transformation of soil management systems and green and blue infrastructure/ Dec 2022	N	
	Identification and protection of potential groundwater reservoirs		Small ponds built or repaired/ Dec 2025	Y	1.1.4 At municipality level, construction or repair of small water ponds / COMPLEMENTARY: RRP
	Efficient water management in the landscape: retention of surface waters through technical and natural measures in order to support water accumulation in periods of drought		Methodology approved/ Dec 2022	Y	1.1.5 Methodological guideline for deceleration of surface water runoff by technical measures, alternate land management systems and building green and blue infrastructure in the landscape and in settlements
		1.2: Protection against floods in order to enhance safety of the population, critical infrastructure and landscape	Methodology developed and approved/ Dec 2025	Y	1.2.2 Methodological support for sustainable landscape, forest management and agriculture with emphasis on water balance and availability

NO = UŽ REALIZOVANÉ ALEBO NIE SÚ POTREBNÉ ZVLÁŠTNE ZDROJE
YES = PROJEKT ALEBO KOMPLEMENTÁRNY ZDROJ

VÝSTUPY PROJEKTU – PRÍKLADY

- Príručka adaptačných riešení pre mestá, obce a vidiecke komunity
- Katalóg prírode blízkych riešení na zadržiavanie vody
- Príručka metodických postupov pre regeneratívne poľnohospodárstvo, agrolesníctvo a živočíšnu výrobu
- Modely a usmernenia alternatívneho plánovania a obhospodarovania lesov (prírode blízke spôsoby hospodárenia)
- Funkčné demonštračné objekty v 5 národných parkoch, 3 povodiach a 3 mestách
- Program vzdelávania ľudských zdrojov

DOPADY PROJEKTU

Príklady:

- Opatrenia na zvýšenie odolnosti miest voči klimatickým zmenám
- Technologický rozvoj – vytvorenie ekosystému pre tvorbu inovácií
- Zlepšenie spolupráce všetkých regionálnych zainteresovaných subjektov
- Vzdelávanie, odstránenie bariér pre realizáciu adaptačných opatrení
- Zapojenie verejnosti do plánovania a realizácie zmien
- Zvyšovanie kvality verejného priestoru a kvality života obyvateľov miest
- Podpora synergie zo spolupráce verejných investorov, súkromných investorov a akademického sektora

PRACOVNÉ BALÍKY

3. IMPLEMENTATION

Fill in only sections 3.1 and 3.3 at stage 1 (concept note). Fill in all sections at stage 2 (full proposal).

3.1. Work plan

Work plan

Provide a brief description of the overall structure of the work plan, together with a graphical presentation of the components showing how they inter-relate (Pert chart or similar).

*Consider dividing your project into **phases**, each one lasting at least 3 years (strongly recommended to reduce the administrative burden). Remember that project monitoring and interim payments are linked to completed phases of the project.*

Present the work done by phase. The reader should get a general idea of the chronology of work packages and their main activities.

A work package (WP) means a major sub-division of the project. The number of work packages should be proportionate to the scale and complexity of the project. WP1 should cover the project management and coordination activities. WP2 (and further WPs) should be used for the other project activities. You can foresee as many work packages as needed.

The work packages should be designed in a way to follow the progress in the implementation of the targeted plan/strategy/action plan (biunivocal linkages as far as possible between work packages and plan/strategy/action plan components/pillars).

Fill in the the Implementation overview for the targeted plan/strategy/action plan (annex). You may adapt the table,

Príklad Work Package 6: Climate change adaptation in cities and municipalities (Human Settlements and Health)

involved partners Ministry of Environment, Pilot Cities, Smart Cities Klub, SAŽP

Task 6.1: Establishment and management of **living labs** in selected Cities: demonstration, validation and promotion of optimised methodologies

Task 6.2: Methodology for identification, eradication and restoration of areas affected by **invasive alien species in cities**

Task 6.3: One-stop-shop **information and advice support** for municipalities and administrations at local level

Task 6.4: **Training** programme

ZÚČASTNENÉ STRANY

Stakeholder engagement

Identify any key stakeholders outside the consortium that are required to ensure the success of the project. How will you mobilise them to contribute to your project activities or participate in these?

Annex letters of support to demonstrate the type and level of commitment already secured (if any).

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
- Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
- Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
- LESY SR, štátny podnik
- Štátna ochrana prírody SR
- Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska
- Únia miest Slovenska
- Úrad verejného zdravotníctva SR

ČASOVÝ PLÁN A ROZPOČET

4. RESOURCES

Fill in only section 4.1 at stage 1 (concept note). Fill in all sections at stage 2 (full proposal).

4.1 Consortium set-up

Consortium cooperation and division of roles (if applicable)

Describe the consortium composition. How will all the partners together bring the necessary expertise?

39

- Projektový zámer (*concept note*) podaný 5. 9. 2024, schválený
- Úplný projektový návrh podaný 6. 3. 2025, schválený
- ***Zapracovanie pripomienok nezávislých medzinárodných hodnotiteľov a príprava grantovej zmluvy do konca roku 2025***
- Začiatok realizácie projektu 1. 1. 2026
- Rozpočet projektu je 17 mil. Eur na 10 rokov
- Rovnomerne rozdelený medzi 4-5 hlavných tematických oblastí Stratégie
- Posilňovanie kapacít existujúcich odborných organizácií – partnerov
- Vysoký potenciál pre mobilizáciu „komplementárneho“ financovania z iných zdrojov (Program Slovensko, Plán obnovy, rôzne komunitárne fondy)

Ďakujem za pozornosť

jozef.turok@sazp.sk

www.sazp.sk
